

# Changement de vos isolateurs : n'oubliez rien !

Clémence Jutard, Clément Carbasse, Emmanuel Coget, Melinda Rigoni, Agnes Roche, Marie-Laure Ducassou, Christelle Cousin, Pascale Brouard

Unité de Pharmacie Oncologique (UPO), Pharmacie, Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes

## Contexte

- **Renouvellement des isolateurs** de notre unité de préparation des chimiothérapies (33 000 préparations/an)
- **Travaux de 5 semaines** (ZAC condamnée)
- **Maintien de l'activité : isolateurs de prêt placés dans la salle de stockage**




## Objectif

- **Retour d'expérience**
- **Aide à la conduite de ce type de projet**

## Matériel et Méthode

- Élaboration d'un **diagramme de Gantt**  
⇒ Représentation chronologique des étapes du projet
- Grandes **thématiques** détaillées en **sous-tâches**

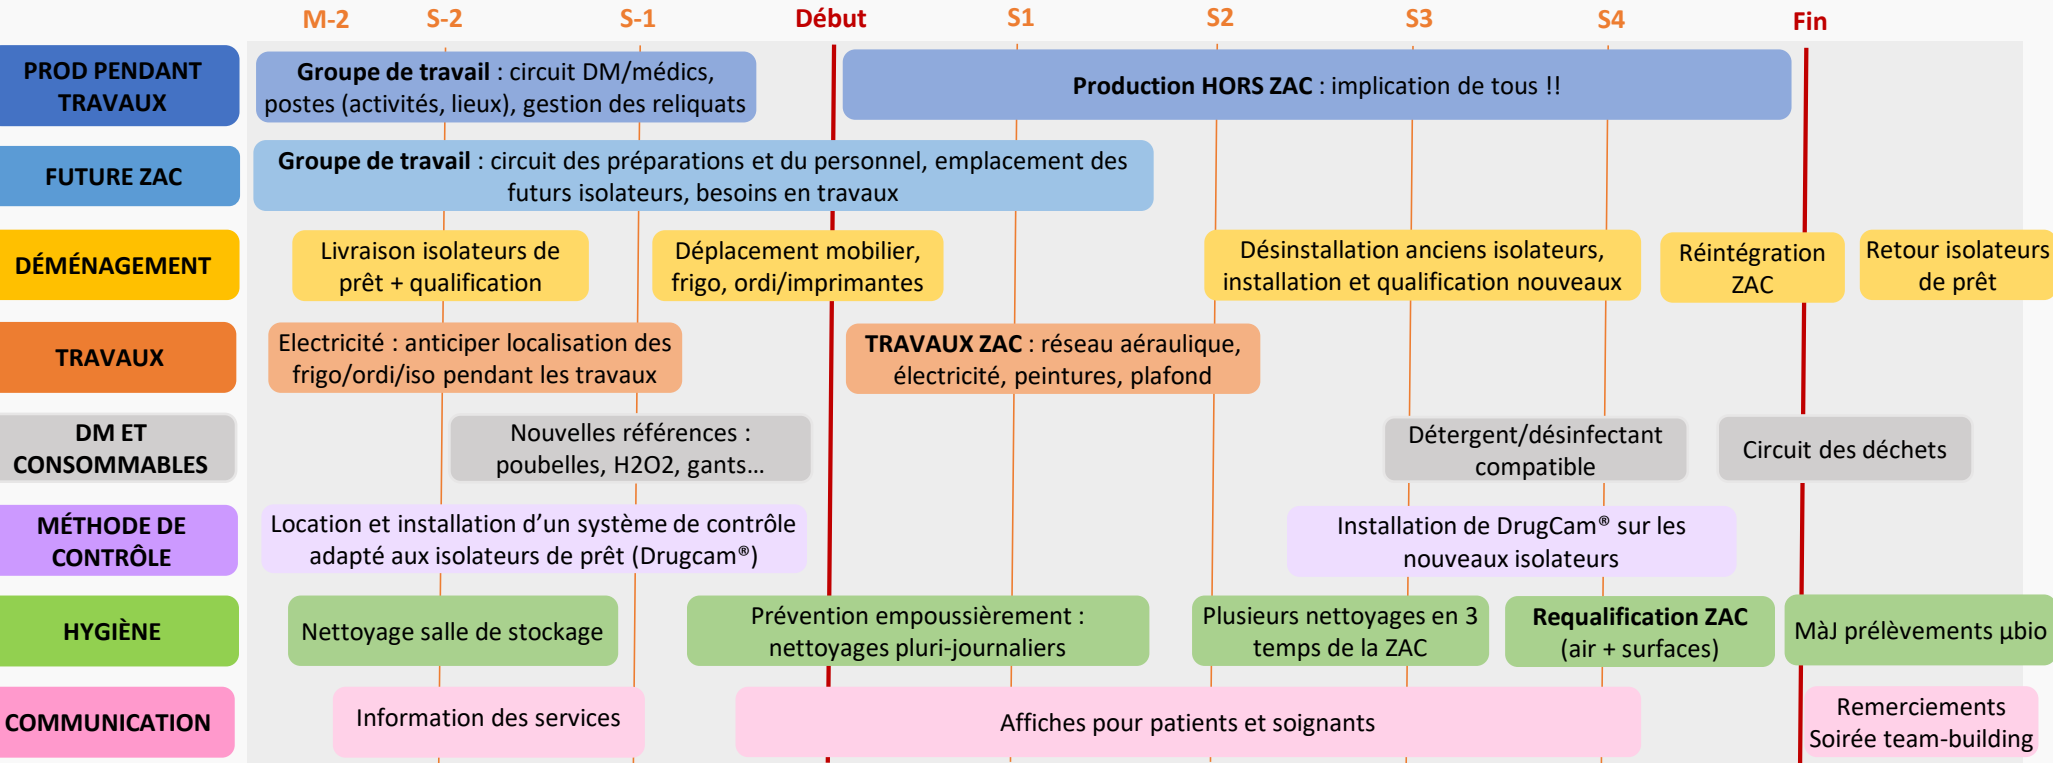

## 1 Coordination

Travaux Prestataires Biomédical Drugcam  
Achats Frigoristes Informatique Isolateurs Logistique

## Conclusion

**Anticipation +++**  
**Implication des équipes +++**  
**Temps prévu pour la gestion des imprévus**



**SUCCES !**

Conduite du projet dans la **sérénité**  
**Maintien de la sécurité des patients**

## 2 Anticipation

- Réviser les procédures d'hygiène
- Prélèvements **microbiologiques** (isolateurs de prêt et nouveaux)
- Choix d'un détergent-désinfectant compatible
- Anticiper l'intervention des prestataires de **requalification** (date **modulable**)

## 3 Astuces

- Groupes de travail pluridisciplinaires **en amont**
- Délocalisation de la production de doses standards de Mab au préparatoire
- Anticiper l'organisation d'**heures supplémentaires** si besoin
- Désigner des **personnes référentes du projet** (temps dédié)

